

### Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 6/09/2021 15:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Áreas con alumbrado público	Mes	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	600000	600000		Ejecución fina	136093.05	25213.62	38764.24	54239.68	254310.59	42.39%	254310.59	42.39%	42.39%	42.39%	
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%	
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	136093.05	25213.62	38764.24	54239.68	254310.59	42.39%	254310.59	42.39%	42.39%	42.39%	
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física	0.90	0.90	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financier	577500	577500		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJAAL RASTRO, CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física	0				0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	577500	577500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente																
Áreas de espacio público gestionadas	Mes	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financier	90000	90000		Ejecución fina	42150	0	23400	0	65550	72.83%	65550	72.83%	72.83%	72.83%	
CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1		1		2	16.67%	2	16.67%	16.67%	16.67%	
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	42150	0	23400	0	65550	72.83%	65550	72.83%	72.83%	72.83%	



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 6/09/2021 15:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país																
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física			0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	500000	500000		Ejecución fina	132500	65095	126533.79	57217.06	381345.85	76.27%	381345.85	76.27%	76.27%	76.27%	
MANEJO BOSQUES NATURALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%	
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	132500	65095	126533.79	57217.06	381345.85	76.27%	381345.85	76.27%	76.27%	76.27%	
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad																
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción	Metro cuadrado	Meta física	35	35	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financier	13322300.78	13322300.78		Ejecución fina	5446845.3	56233	849917	2476312.7	8829308.08	66.27%	8829308.08	0%	66.27%	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECAMPO CANTÓN PALÁ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	787500	787500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LOS JUAREZ ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	580	580	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	367500	367500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ZAC SIWAN CANTÓN TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	940	940	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	593250	593250	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PAXTORES CANTÓN CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1400	1400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	892500	892500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR LOS ALVARADO, CANTÓN PAXÁN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	375	375	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	
		Meta financiera	787500	787500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 6/09/2021 15:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA LOMA DOS, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	1				1	0.08%	1	.08%	0.08%	.08%
		Meta financiera	787500	787500	0	Ejecución financiera	767125	0	0	0	767125	97.41%	767125	97.41%	97.41%	97.41%
CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Meta física	90	177	1	Ejecución física				160	160	90.4%	160	90.4%	177.78%	177.78%
		Meta financiera	873520	873520	0	Ejecución financiera	0	0	0	786168	786168	90%	786168	90%	90%	90%
CONSERVACION CAMINO RURAL 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	1100000	1100000	0	Ejecución financiera	224011.29	42118	58858	64372.50	389359.79	35.4%	389359.79	35.4%	35.4%	35.4%
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	44553.25	12115	41259	12897.26	110824.51	55.41%	110824.51	55.41%	55.41%	55.41%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON DALMACIO CHANAX A PARAJE LA JOYA, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1			0	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	1002000	1002000	0	Ejecución financiera	250625	0	0	751375	1002000	100%	1002000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MOLINO, CANTÓN CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1			0	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	1003000	1003000	0	Ejecución financiera	767125	0	0	110875	878000	87.54%	878000	87.54%	87.54%	87.54%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANCHE, CANTON TZANJUYUP, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	41944	41944	0	Ejecución financiera	41944	0	0	0	41944	100%	41944	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASA DE DON CHUS A CENTRO DE CANTON PAXAN, FASE II, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	599000	599000	0	Ejecución financiera	599000	0	0	0	599000	100%	599000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROBLES, FASE II, CANTON PAXAN, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	598600	598600	0	Ejecución financiera	598600	0	0	0	598600	100%	598600	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANTONIO COS,	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 6/09/2021 15:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ANTONIO COS,	Unidad	Meta financiera	116821.56	116821.56	0	Ejecución financiera	116821.56	0	0	0	116821.56	100%	116821.56	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHMASM, CANTON PALA, SAN FRANCISCO LA UNION QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	119940	119940	0	Ejecución financiera	119940	0	0	0	119940	100%	119940	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUE JAPON, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	149882.40	149882.40	0	Ejecución financiera	149882.40	0	0	0	149882.40	100%	149882.40	100%	100%	100%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ZAC SIWAN, CANTÓN TZANJUJUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física			1		1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	749800	749800	0	Ejecución financiera	0	0	749800	0	749800	100%	749800	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR XOLJA, CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	71960	71960	0	Ejecución financiera	71960	0	0	0	71960	100%	71960	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DON VICTOR, CANTON CHUISTANCIA, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	308658.82	308658.82	0	Ejecución financiera	308658.82	0	0	0	308658.82	100%	308658.82	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DIAGONAL A LA IGLESIA CATOLICA, ALDEA XEAJ, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO.	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	32200	32200	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA JOYA, ALDEA XEAJ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1	0			1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	408119	408119	0	Ejecución financiera	406119	2000	0	0	408119	100%	408119	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUI MARTIN, CANTÓN CHUISTANCIA SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	195617	195617	0	Ejecución financiera	195617	0	0	0	195617	100%	195617	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHANAX, CANTÓN PALÁ SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	187369	187369	0	Ejecución financiera	187369	0	0	0	187369	100%	187369	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUWICHAJ, CA	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 6/09/2021 15:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUWICHAJ, CA	Unidad	Meta financiera	345619	345619	0	Ejecución financiera	345619	0	0	0	345619	100%	345619	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1			0	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	1002500	1002500	0	Ejecución financiera	251875	0	0	750625	1002500	100%	1002500	100%	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Mes	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	480649	480649		Ejecución fina	99513	0	43100	319499	462112	96.14%	462112	90.73%	96.14%	90.73%
APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	4		1	1	6	50%	6	50%	50%	50%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	99513	0	43100	38850	181463	90.73%	181463	90.73%	90.73%	90.73%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTÓN PAXÁN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física				1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	280649	280649	0	Ejecución financiera	0	0	0	280649	280649	100%	280649	100%	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	620773.60	620773.60		Ejecución fina	452846.99	0	43750	48719.94	545316.93	87.84%	545316.93	69.82%	87.84%	69.82%
APOYO A LA EDUCACION BÁSICA Y DIVERSIFICADA 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	4		1	1	6	50%	6	50%	50%	50%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	82073.39	0	43750	48719.94	174543.33	69.82%	174543.33	69.82%	69.82%	69.82%
MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO SECTOR XOLJUYUP, CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	370773.60	370773.60	0	Ejecución financiera	370773.60	0	0	0	370773.60	100%	370773.60	100%	100%	100%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 6/09/2021 15:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total						
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física						0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2141750	2141750		Ejecución fina	859246.13	223366.54	184258.56	196632.25	1463503.48	68.33%	1463503.48	0%	68.33%	0%	0%
CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA (TECHADO), SECTOR TZANCHE, CANTÓN TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	141750	141750	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	859246.13	223366.54	184258.56	196632.25	1463503.48	73.18%	1463503.48	73.18%	73.18%	73.18%	73.18%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financier	262500	262500		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%	0%
AMPLIACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS HERNANDEZ UNO, CANTÓN CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiera	262500	262500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Mes	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financier	250000	250000		Ejecución fina	103753.75	16215	26080	22880	168928.75	67.57%	168928.75	67.57%	67.57%	67.57%	67.57%
MANEJO SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1	1	1	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	103753.75	16215	26080	22880	168928.75	67.57%	168928.75	67.57%	67.57%	67.57%	67.57%



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 6/09/2021 15:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Mes	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	114000	114000		Ejecución financiera	1500	0	0	0	1500	1.32%	1500	1.67%	1.32%	1.67%
CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1				1	8.33%	1	8.33%	8.33%	8.33%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	1500	0	0	0	1500	1.67%	1500	1.67%	1.67%	1.67%
CONSERVACION CEMENTERIO 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	24000	24000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	650000	650000		Ejecución financiera	42040	4750	0	15857.50	62647.50	9.64%	62647.50	0%	9.64%	0%
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO), SECTOR EL RASTRO, CANTON CENTRO, SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	520	520	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	4	1	0	1	6	50%	6	50%	50%	50%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	42040	4750	0	15857.50	62647.50	31.32%	62647.50	31.32%	31.32%	31.32%



### Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION**

Fecha y Hora: 6/09/2021 15:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Mes	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	150000	150000		Ejecución fina	44231	18630.15	557	29575.68	92993.83	62%	92993.83	62%	62%	62%
CAPACITACION TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	3	1	1	1	6	50%	6	50%	50%	50%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	44231	18630.15	557	29575.68	92993.83	62%	92993.83	62%	62%	62%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables															
Población en condición de vulnerabilidad atendida	Persona	Meta física	125	125	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	49200	0	0	0	49200	0%	49200	82%	0%	82%
APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTOS SOCIALES 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	125	125	1	Ejecución física	125				125	100%	125	100%	100%	100%
		Meta financiera	60000	60000	1	Ejecución financiera	49200	0	0	0	49200	82%	49200	82%	82%	82%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	24000	24000		Ejecución fina	10000	4000	0	4000	18000	75%	18000	75%	75%	75%
APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBESTACION POLICIAL PNC 2021 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	5	1		1	7	58.33%	7	58.33%	58.33%	58.33%
		Meta financiera	24000	24000	0	Ejecución financiera	10000	4000	0	4000	18000	75%	18000	75%	75%	75%

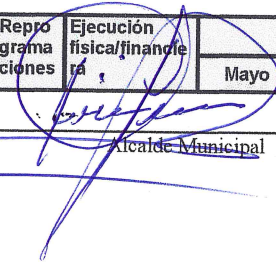


### Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO LA UNION

Fecha y Hora: 6/09/2021 15:24

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					

F:   
Alcalde Municipal

